




GREEN HARBOR TECHNOLOGY
VIKINGEGAARDEN A/S

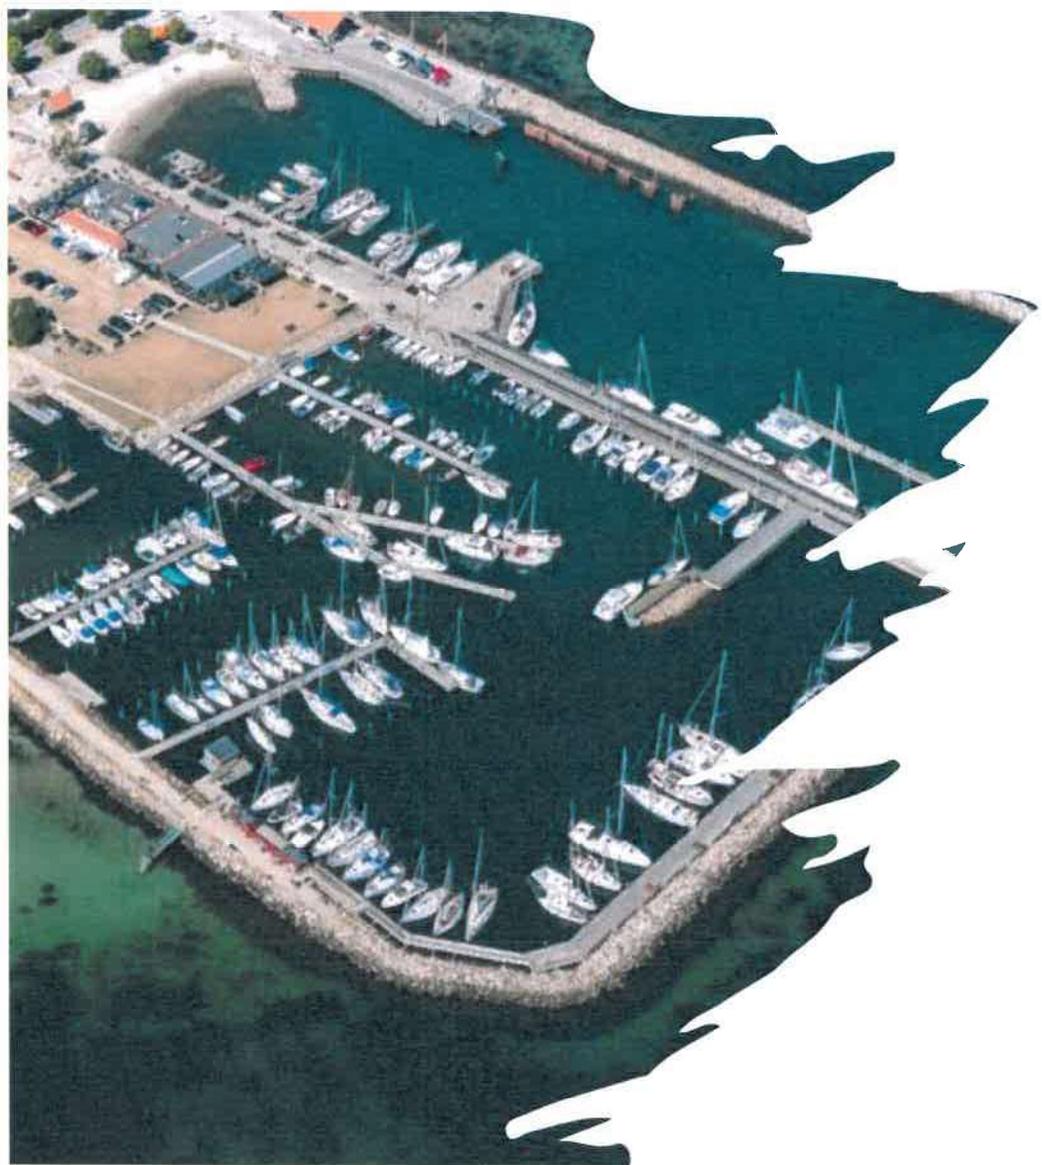

Rørvig Havn – Fase 2 *Scope of Work*

Modernisering af Rørvig Havn – i 2 Faser


Fase 1

- Område 1:
Betonbro & Bølgebryder i Færgeløje.
 - Denne Fase er allerede etableret, og derfor ikke længere aktuell.


Fase 2

- Område 2: TO nye Træbeton Flydebroer
- Område 3: TO nye Træbeton Flydebroer (ændret)

Denne præsentation beskriver løsninger for Fase 2, der indbefatter Område 2 & 3 på kortet.

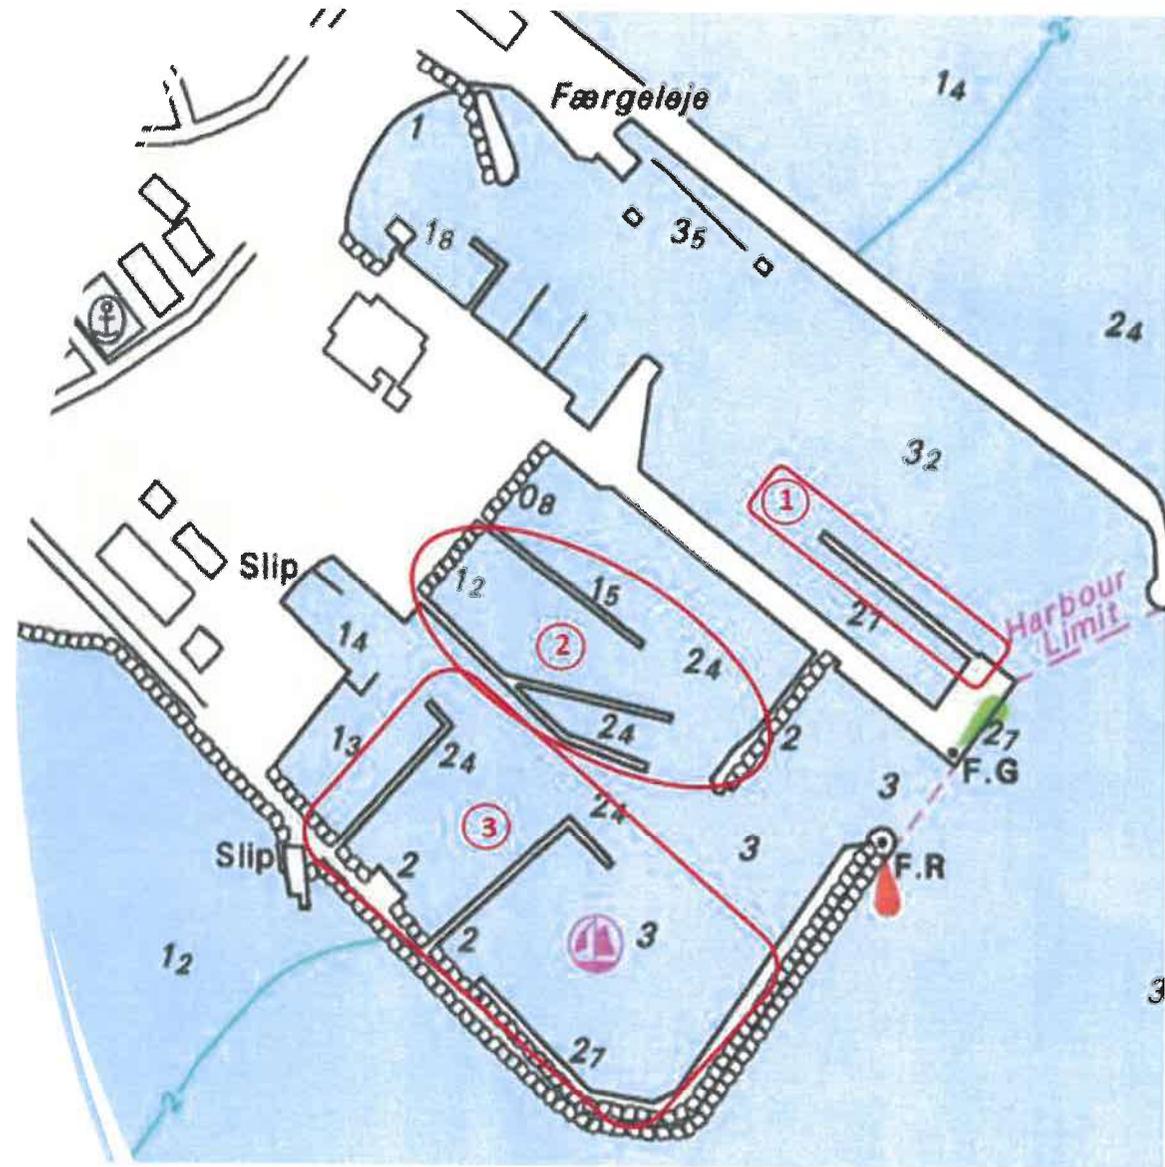

Overblik – Rørvig Havn Fase 2 (opdateret)

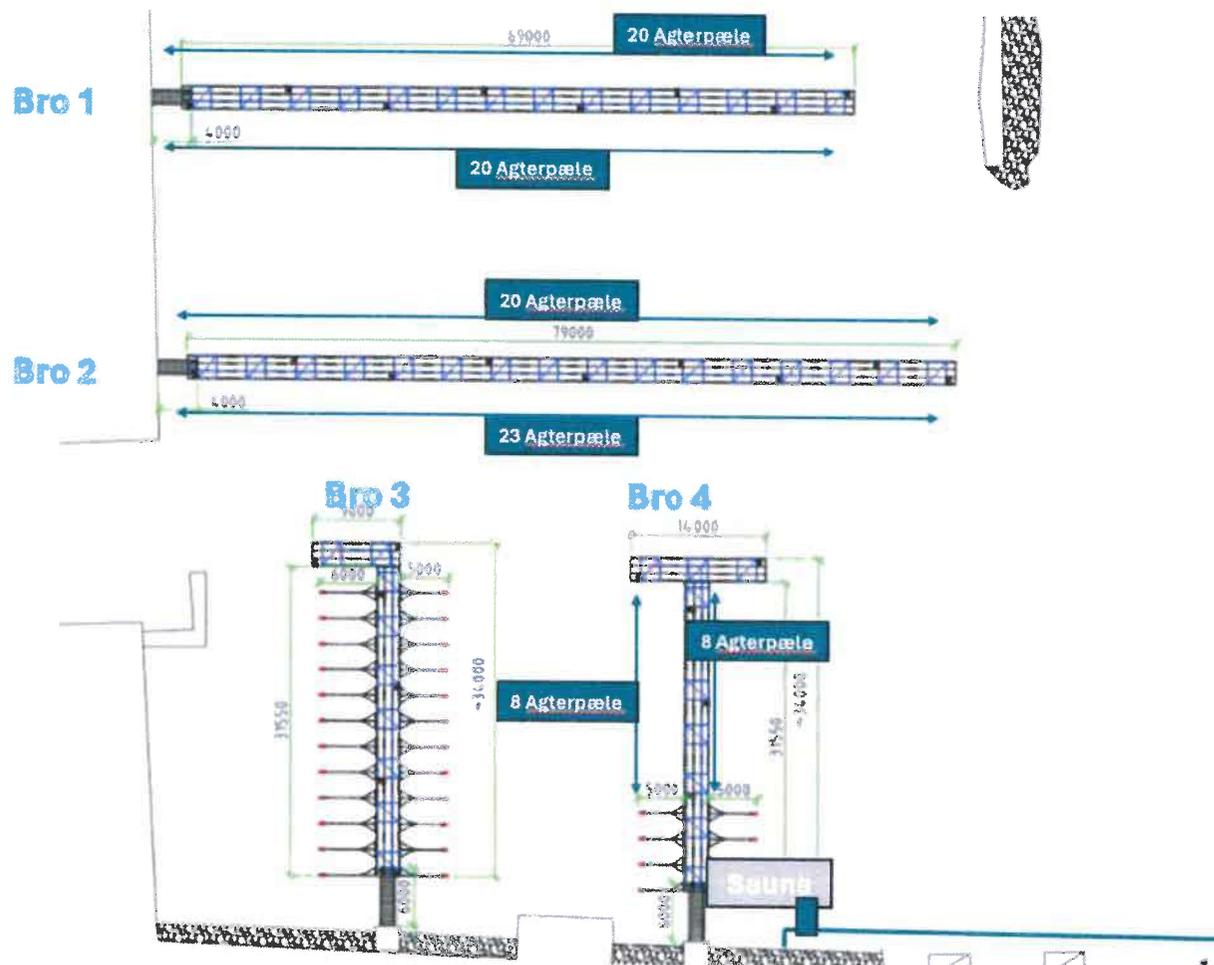

PROJEKT / TIDSPLAN

Projektaktiviteter

	Antal	Enhed	Kommentar
Projekt Kick-Off on site			Møde afholdt d. 4. September
Gennemgang af final projekt med underleverandører			ARKIL og Pontech
Detaljeret Projektplan			Forventes leveret
Accept af Projektplan			Forventet dato: Medio uge 38

Produktion

Broer
Beslag
Landgange
Stål-pæle

Projektarbejde ARKIL

Mobilisering I havn / Anstilling	1	stk	Forventet dato: 7. Oktober
Nedbrydning & Fjernelse af eksisterende broer	297	lbm	
Optrækning & Fjernelse af Træpæle	290	stk	
Nedramning af Stålrør / pæle. MED Flydebroer monteret	39	stk	Færdig senest 15. Nov.
Plastrør til pæle monteres	39	stk	Færdig senest 22. Nov. Gøres løbende
Bortskaffelse & Deponering af træ fra broer			
Etablering af Landfæste	2	stk	
Etablering af 2 x ramper + 1 x forstærkning	2	stk	Færdig senest 15. Nov.
Nedramning af WOPAS agterpæle	108	stk	Færdig senest 6. Dec.
Montage af fortøjningsringe	108	stk	Færdig senest 13. Dec.
De-mobilisering			Forventet dato: 13. December

Frugt og Levering

Frugt & Levering Forankrings-pæle			Senest omkring d. 30. Okt.
Frugt & Levering - Broer part 1 (Bro 3-5 + Sauna platform)	6	Lastbiler	Forventet dato: 29. Okt.
Mobilkran			Forventet dato: 29. Okt.
Frugt & Levering - Broer part 2 (Bro 1-2)	7	Lastbiler	Forventet dato: 30. Okt.
Lastbilskran			Forventet dato: 30. Okt.

Projektarbejde GHT & PONTECH

Broer: 3, 4 & 5 + Saunaplatform			
Søsætning (med Mobilkran):			Søsætning d. 29. Okt.
Montage Broer			Forventet uge 45
Montage Landgange			Forventet uge 45
Montage Beton pontoner - sauna platform			Slut af uge 45

Broer: 1 + 2			
Søsætning (med Mobilkran):			Søsætning d. 30. Okt.
Montage Pontoner			Forventet uge 46
Montage Landgange			Slut af uge 47

Del-aflevering: Flydebroer Senest d. 18. Nov.

Afl levering af projekt Senest d. 13. Dec.

